

## 6日目 (6/5PM)


6日目。いよいよ、掘った穴に鞘管を挿入しました！まず6メートルにつなぎ合わせ、それを入れました。順調にグイグイ入っていき、そのあと、2メートルをつなぎ合わせてまた掘った穴の中に入れていきました。



6メートルはすんなり入ったのですが、まっすぐ穴を掘れていなかったため、その後がなかなかうまくいかず苦戦しました。かけやを使って中に押し込んだり、鞘管に穴を開け、その中に鉄の棒をさし、それをみんなでまわしたり、様々な方法で押し込みました。



なんとか9メートルまで押し込みました。これだけ入っていたら大丈夫だろうということ、出っ張った部分を切って鞘管挿入は完成。その後、3センチの細い管をその中にいれて、いよいよポンプの設置！

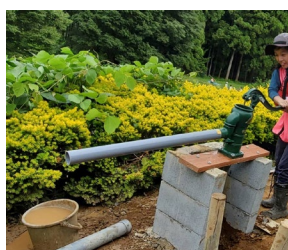

ポンプを設置し、いざ押し上げると！！水が出た！！のもつかの間。泥や砂が詰まって思うようにでませんでした。次回に持ち越し！（参加者7名）

## 7日目 (6/11AM)

泥や砂がつまるので、はじめに泥と砂抜き作業。そのあと、鞘管と細い管の間に中くらいの管を入れることに。その後、再度ポンプ設置。

いざ、押し上げると・・・詰まることなく、順調に水が出ました！はじめはコーヒー牛乳のような水が、しばらくするとそれが薄くなり、途切れることなく水が出ました！！最後に水受けを設置し、完成！！（参加者11名）



# 完成！
